

Urząd Miejski w Łomiankach

<https://lomianki.pl/pl/aktualnosci/13712,Prace-budowlane-w-gminie.html>
25.04.2024, 05:35

Prace budowlane w gminie

Kolejne inwestycje.

WYDZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

Prace w trakcie realizacji:

- ▶ ul. Piaskowa: w budowanym przedszkolu miejskim w Dąbrowie kończy się montaż stolarki zewnętrznej oraz trwają prace przy instalacjach wewnętrznych budynku,
- ▶ ul. Strzelecka: w budowanej szkole podstawowej w Sadowej nadal prowadzone są prace przy instalacjach wewnętrznych i elewacji budynku, na bieżąco wybierane są materiały wykończeniowe, wykonano przyłącze kanalizacyjne,
- ▶ ul. Porzeczkowa: prace rozbiórkowe i roboty ziemne, wykonawca realizuje budowę drenu francuskiego wraz z zabezpieczeniem,
- ▶ ul. Sierakowska: wykonywane są warstwy konstrukcyjne pod docelowe mieszanki mineralno-asfaltowe rozbudowywanej drogi,
- ▶ ul. Zachodnia: zagospodarowanie pasa zieleni ulicy w ramach pierwszego etapu inwestycji „Budowa Parku Artystów” – wybudowano strefę aktywną i zamontowano trampoliny z bezpieczną nawierzchnią, strefę wejścia ze słupem oświetleniowym oraz elementy małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci), zamontowano też oświetlenie ciągu pieszego, do wykonania pozostało ułożenie nawierzchni ścieżki oraz zamontowanie ławek,
- ▶ ul. Rodziewiczówny: po raz kolejny ogłoszono przetarg na wykonanie elementów małej architektury wraz z budową dwóch boisk (do koszykówki 3x3 i do badmintonu/piłki plażowej) oraz ścianki wspinaczkowej na placu zabaw,
- ▶ ul. Waligóry: podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej odcinka 300 m ulicy od opaski ul. Kolejowej.

Prace zrealizowane:

- ▶ ul. Spokojna: na odcinku od ul. Jeziornej do ul. Fabrycznej zdemontowano stary próg zwalniający U-16a i zamontowano dwa progi U-16d, zamontowano także sześć luster drogowych zapewniających widoczność, ustawiono znaki B-5 (zakaz wjazdu dla samochodów ciężarowych), a także znak D-40 (informacja m.in. o parkowaniu tylko w miejscach do tego wyznaczonych, pierwszeństwie pieszych przed pojazdami, dopuszczalnej maksymalnej prędkości 20 km/h),
- ▶ ul. Staszica 2: na pływalni ICDS wymieniono 18 opraw świetlówkowych na oprawy oświetleniowe LED, nowe lampy mają pięć lat gwarancji i zapewniają do 50 proc. oszczędności

na kosztach energii elektrycznej w porównaniu z wcześniej stosowaną technologią.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Prace w trakcie realizacji:

- ▶ ul. Waligóry: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej; obecnie prace prowadzone są w godz. 7.30 -17.00 na odcinku od posesji nr 15 w kierunku ul. Rolniczej, na koniec dnia wykopy będą zasypywane w celu utrzymania przejazdu, mogą wystąpić punktowe utrudnienia z dostępem do posesji; odbiór odpadów i wywóz nieczystości nastąpi do godz. 7.30 lub po godz. 17,
- ▶ ul. Wiślana i Łużycka: prace w ul. Wiślanej przy montażu przepompowni na wysokości posesji 28A (odcinek między ul. Łużycką a ul. Fabryczną) oraz w ul. Łużyckiej na odcinku od ul. Kamińskiego do ul. Wiślanej,
- ▶ ul. Rolnicza: prace na odcinku od ul. Podróźnej w kierunku gminy Czosnów, ruch w dalszym ciągu odbywa się w sposób wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną; rozpoczną się prace związane z odtwarzaniem nawierzchni asfaltowej po wykonanych pracach na odcinku od ul. Wiklinowej do ul. Podróźnej; w związku z tym od 21.02 br. nastąpiły zmiany w kursowaniu autobusów linii 750 i 850, i uruchomiono linię zastępczą (więcej informacji: Komunikacja Miejska w Łomiankach, www.kmlomianki.info); zalecamy wybieranie dróg poprzecznych dochodzących do ul. Rolniczej, a wszystkich mieszkańców poruszających się w obrębie inwestycji prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonej tymczasowej organizacji ruchu,
- ▶ ul. Agawy, Armii Poznań, Wiślana: budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Agawy (7, 7E, 9A), ul. Armii Poznań (12B, 12C, 14A, 14B), ul. Wiślana (nr ewidencyjne: 166/4, 166/5, 166/6, 166/7, 231/3 obręb 0024),
- ▶ ul. Wiślana: w marcu podpisano umowę na budowę 340 m.b. sieci wodociągowej na odcinku od ul. Akacyjnej do ul. Leśnych Dębów, termin zakończenia inwestycji – 20.08 br

Inwestycje planowane:

- ▶ „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sierakowskiej, Łuże, Ofiar Katynia, Ułanów Jazłowieckich, Zielonej oraz sięgaczach wymienionych ulic na terenie gminy Łomianki”. Przetarg został unieważniony. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Przetarg zostanie ponowiony.
- ▶ „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Kościelna Droga oraz al. Chopina w Łomiankach Dolnych – etap II; II postępowanie”. Trwa weryfikacja ofert.
- ▶ „Dokończenie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów w Łomiankach (na odcinku od ul. Kwiatowej do ul. Konwaliowej) oraz w alei Lip w Łomiankach (na

całej długości) – II postępowanie”. W drugim postępowaniu żadna z firm nie złożyła oferty.

Prace zrealizowane:

- ▶ Zbudowano sieć wodociagową i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kampinoskiej; Jesionowej, Willowej, Koncertowej, Morelowej oraz ich drogach dojazdowych; Żwirowej, Partyzantów (na odcinku od ul. Akacyjowej do ul. Kwiatowej). W związku z zakończeniem budowy oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie zachęcamy mieszkańców do przyłączenia się do nowej sieci wodno-kanalizacyjnej.

Więcej informacji: www.zwik-lomianki.pl (w zakładce Dla mieszkańców – Podłącz się) lub pod nr. tel.: 22 751 35 04, 513 181 103.

Radosław Nowak, Tomasz Czajkowski, Michał Karolak



Budowa Przedszkola w Dąbrowie.




Budowa Przedszkola w Dąbrowie.



Budowa Przedszkola w Dąbrowie.




Budowa Szkoły w Sadowej

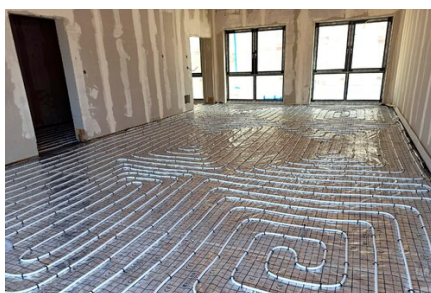

Budowa Szkoły w Sadowej




Budowa Szkoły w Sadowej

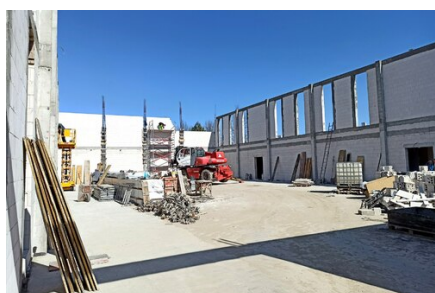


Budowa Szkoły w Sadowej



Budowa Szkoły w Sadowej

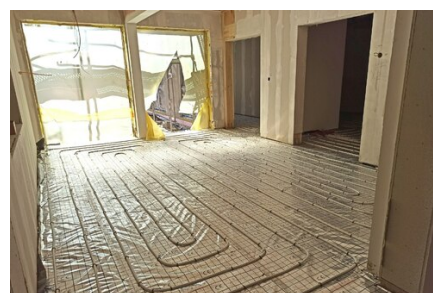

Budowa Szkoły w Sadowej

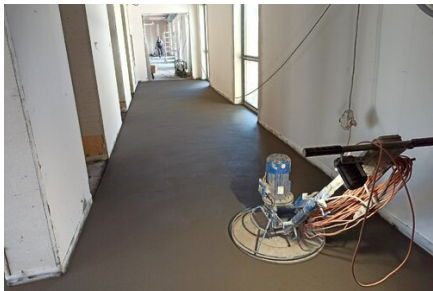

Budowa Szkoły w Sadowej



ul. Spokojna



ul. Spokojna



ul. Spokojna



ul. Rolnicza



Park Artystów



Park Artystów
